



**ANEXO ÚNICO DEL CONVENIO MODIFICATORIO:
“Anexo 2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJETO DEL APOYO”
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A 13 CENTROS DE SALUD**

Nº	CLUES	NOMBRE UNIDAD	ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	MONTO
1	CSSSA000045	H. B. C. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ACALA	conservación y mantenimiento	\$ 3,456,643.04
2	CSSSA000832	H. B. C. DE CINTALAPA DE FIGUEROA	conservación y mantenimiento	\$ 3,041,846.62
3	CSSSA003265	H. B. C. DE LAS MARGARITAS	conservación y mantenimiento	\$ 4,803,729.05
4	CSSSA005645	HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SALTO DE AGUA	conservación y mantenimiento	\$ 1,801,343.40
5	CSSSA009273	HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE CHIAPA DE CORZO	conservación y mantenimiento	\$ 1,451,695.58
6	CSSSA017504	H. B. C. DEL PORVENIR	conservación y mantenimiento	\$ 3,506,567.68
7	CSSSA017516	H. B. C. DE REVOLUCIÓN MEXICANA	conservación y mantenimiento	\$ 3,736,151.94
8	CSSSA017521	H. B. C. DE TAPILULA	conservación y mantenimiento	\$ 2,974,958.92
9	CSSSA018740	H. B. C. DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ PIJJIAPAN	conservación y mantenimiento	\$ 534,371.80
10	CSSSA018752	H. B. C. DE TEOPISCA	conservación y mantenimiento	\$ 1,634,095.19
11	CSSSA019481	H. B. C. DE SAN JUAN CHAMULA	conservación y mantenimiento	\$ 2,701,227.64
12	CSSSA019645	H. B. C. DE OCOSINGO	conservación y mantenimiento	\$ 2,973,235.08
13	CSSSA009203	H. B. C DE BERRIOZABAL	conservación y mantenimiento	\$ 1,415,891.06

\$ 34,031,757.00



ANEXO 1
MONTO DE LOS RECURSOS Y PERIODO DE TRANSFERENCIA
(Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

Partida de Gasto	Importe Total	Periodo de Transferencia
43401	\$34,031,757.00	A partir del mes de agosto de 2023

ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS PARA LLEVAR A CABO ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA, EN LA MODALIDAD DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CON CARGO A LOS RECURSOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E001 “ATENCIÓN A LA SALUD DE PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL” PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023, QUE CELEBRAN SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2023.

gh ↑

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS
Empresa:	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (II):	ING. SERGIO CARPIO CARDENAS
Monto Contratado:	\$2,973,235.08
Fecha de Inicio de los Trabajos:	03 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	15 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FOTO EXTERIOR (FACHADA)



FOTO EXTERIOR (JARDINERIA)



FOTO INTERIOR (SALA DE ESPERA /MURAL)



FOTO INTERIOR (CONSULTORIO/HOSPITALIZACIÓN)

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS
Empresa:	ING. PEDRO ANTONIO GARCÍA BALLINAS
Supervisor del Distrito (VIII):	ARQ. MANUEL DE JESUS SARAUZ DE LOS SANTOS
Monto Contratado:	\$2,973,235.08
Fecha de Inicio de los Trabajos:	03 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	15 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

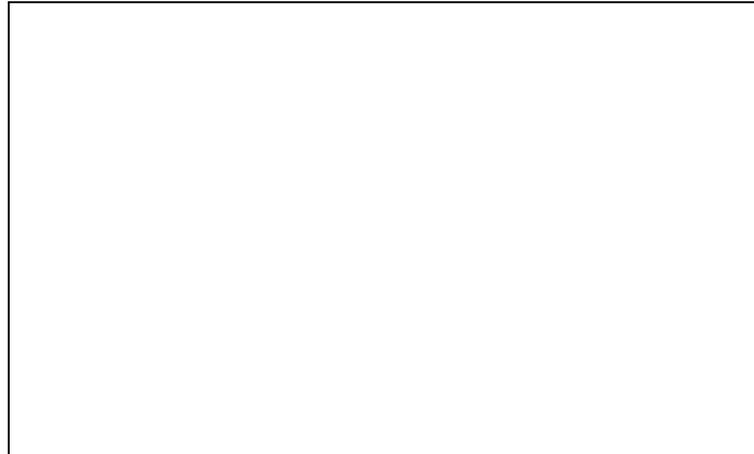


FOTO EXTERIOR (FACHADA)

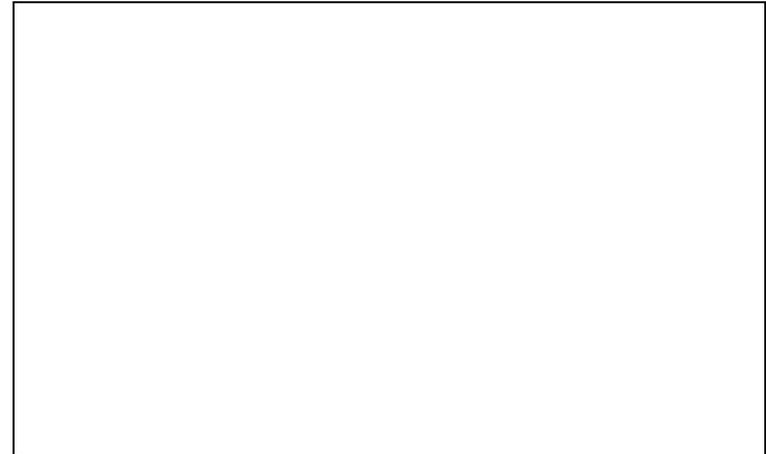


FOTO EXTERIOR (JARDINERIA)

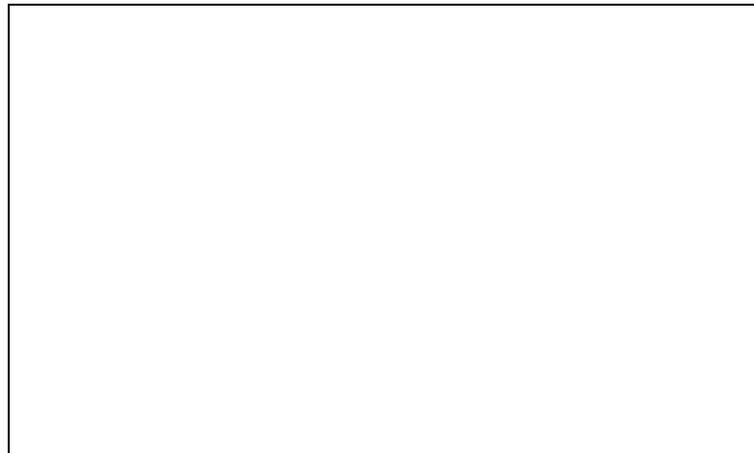


FOTO INTERIOR (SALA DE ESPERA /MURAL)



FOTO INTERIOR (CONSULTORIO/HOSPITALIZACIÓN)

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLA CORZO, CHIAPAS
Empresa:	MIRELLA ESTUDILLO LÓPEZ
Supervisor del Distrito (IV):	ARQ. ADAN NEHEMIAS MARTINEZ RAMIREZ
Monto Contratado:	\$3,736,151.94
Fecha de Inicio de los Trabajos:	06 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	18 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FOTO EXTERIOR (FACHADA)



FACHADA



FOTO INTERIOR (SALA DE ESPERA /MURAL)



FOTO INTERIOR (CONSULTORIO/HOSPITALIZACIÓN)

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TAPILULA, MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS
Empresa:	CUIDA, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (V):	ING. DOMINGO JAVIER CALCANELO GALINDO
Monto Contratado:	\$2,974,958.92
Fecha de Inicio de los Trabajos:	06 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	18 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FOTO EXTERIOR (FACHADA)



FACHADA

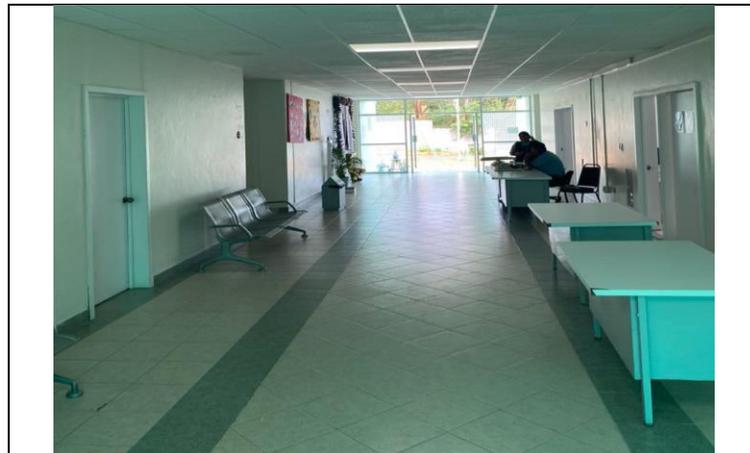


FOTO INTERIOR (SALA DE ESPERA /MURAL)



FOTO INTERIOR (CONSULTORIO/HOSPITALIZACIÓN)

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BASICO COMUNITARIO DE CHIAPA DE CORZO, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS
Empresa:	MIRELLA ESTUDILLO LÓPEZ
Supervisor del Distrito (V):	ING. ARLEIN SANCHEZ HERNANDEZ
Monto Contratado:	\$1,451,695.58
Fecha de Inicio de los Trabajos:	06 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	18 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FOTO EXTERIOR (FACHADA)



FACHADA



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

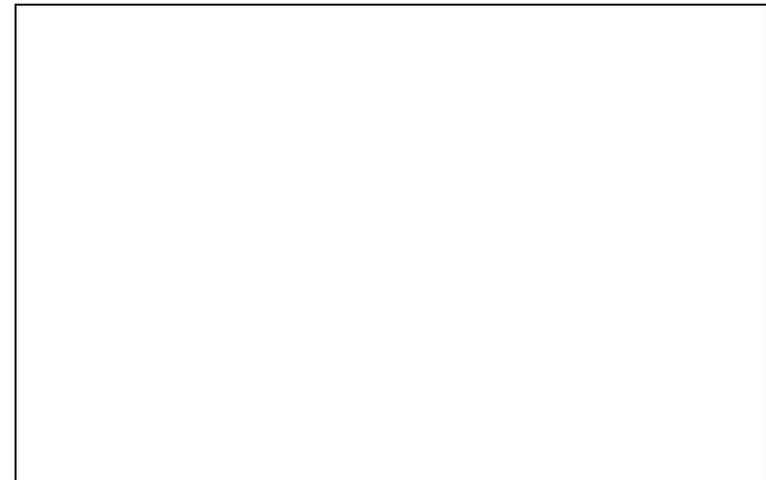


FOTO INTERIOR (CONSULTORIO/HOSPITALIZACIÓN)

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ACALA, MUNICIPIO DE ACALA, CHIAPAS
Empresa:	CUIDA, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (V):	ING. ARLEIN SANCHEZ HERNANDEZ
Monto Contratado:	\$3,456,643.04
Fecha de Inicio de los Trabajos:	06 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	18 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FACHADA



ÁREA EXTERIOR



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN




FOTO INTERIOR (CONSULTORIO/HOSPITALIZACIÓN)

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS
Empresa:	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (V):	ING. ARLEIN SANCHEZ HERNANDEZ
Monto Contratado:	\$3,506,567.68
Fecha de Inicio de los Trabajos:	09 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	30 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %


ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FACHADA

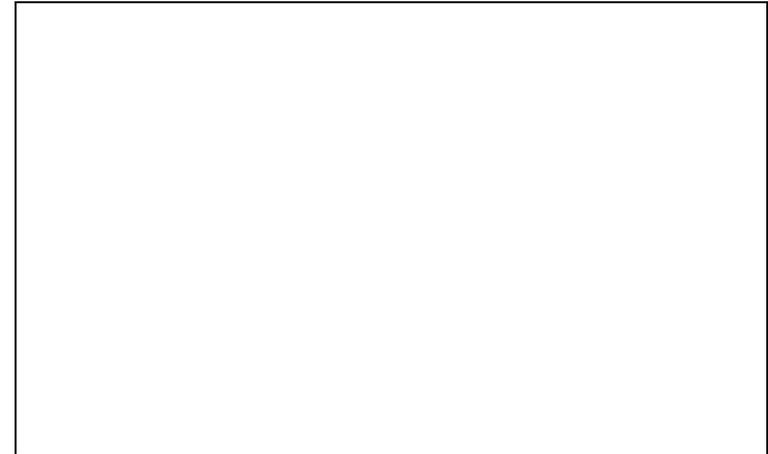

ÁREA EXTERIOR



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

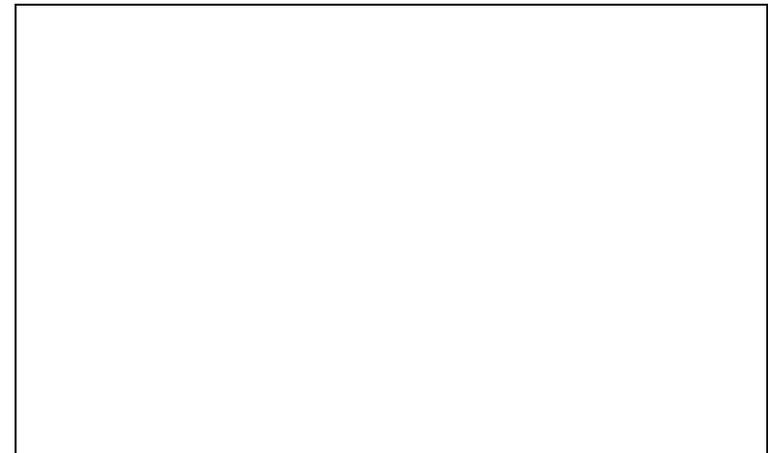


FOTO INTERIOR (CONSULTORIO/HOSPITALIZACIÓN)

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS
Empresa:	GRUPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ALCAZAR, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (III):	ARQ. FEDERICO ORTEGA PINTO
Monto Contratado:	\$4,803,729.05
Fecha de Inicio de los Trabajos:	09 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	30 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %


ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FACHADA



ÁREA EXTERIOR



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN




SALA DE ESPERA

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TEOPISCA, MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS
Empresa:	VELFER INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (II):	ING. SERGIO CARPIO CARDENAS
Monto Contratado:	\$1,634,095.19
Fecha de Inicio de los Trabajos:	13 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	23 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %


ALBÚM FOTOGRÁFICO




FACHADA

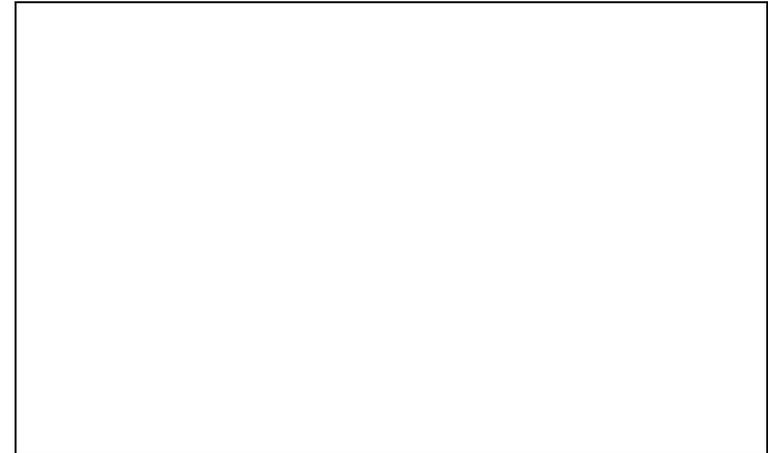

ÁREA EXTERIOR

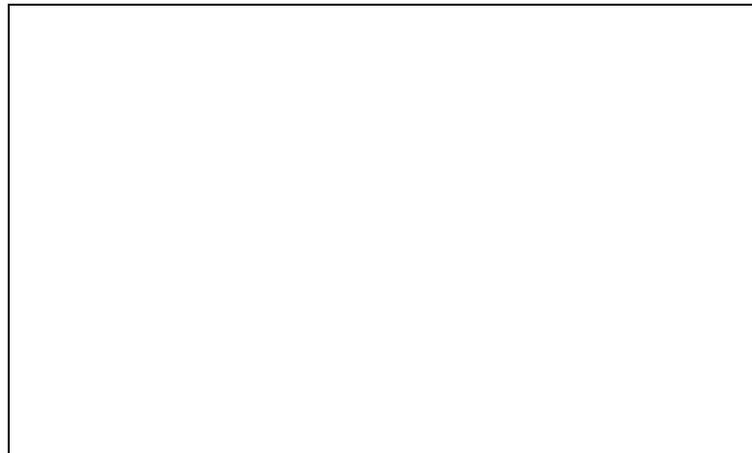


TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

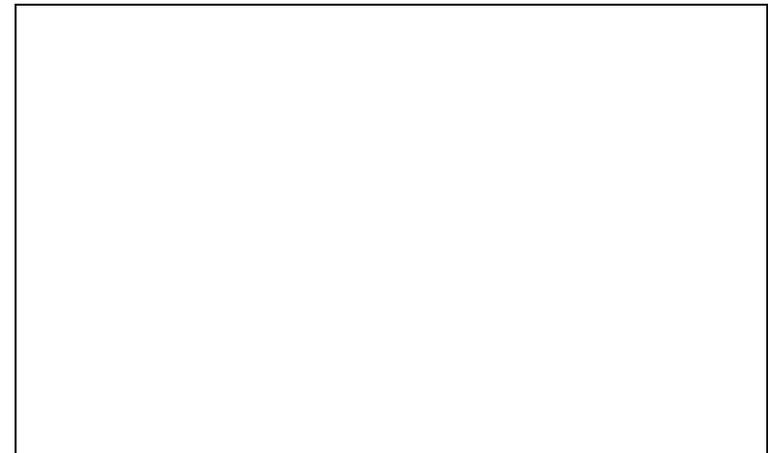


SALA DE ESPERA

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL H. B. C. DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ PIJIJAPAN, MUNICIPIO DE PIJIJAPAN, CHIAPAS
Empresa:	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (VIII):	ARQ. ALEX URIEL ALFARO HERNANDEZ
Monto Contratado:	\$534,371.80
Fecha de Inicio de los Trabajos:	05 de octubre 2023
Fecha final de los trabajos:	03 de noviembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO

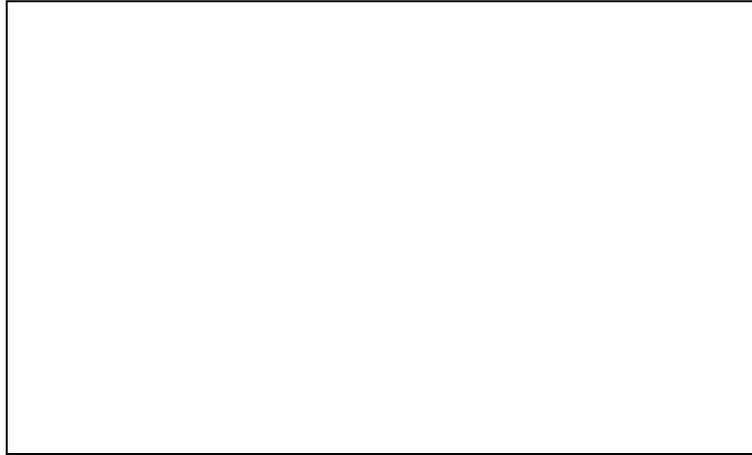

FACHADA

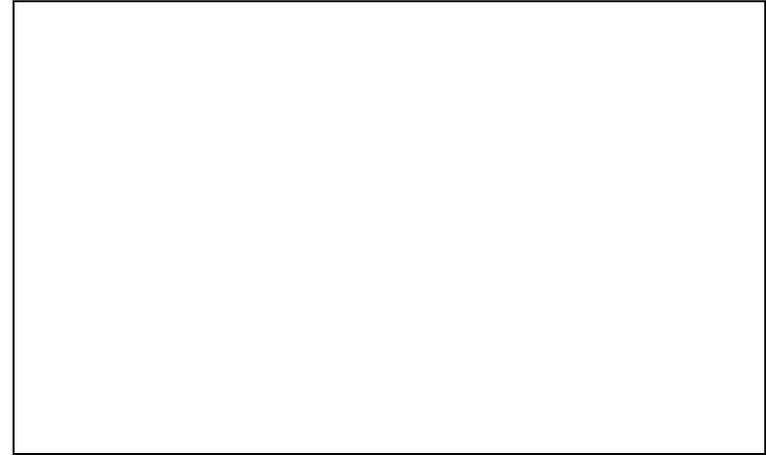

ÁREA EXTERIOR



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN



SALA DE ESPERA

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SALTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA
Empresa:	AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (VI):	ING. ROGER DAVID GONZALEZ TACIAS
Monto Contratado:	\$1,801,343.40
Fecha de Inicio de los Trabajos:	10 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	09 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FACHADA



ÁREA EXTERIOR



ÁREA EXTERIOR



ÁREA EXTERIOR

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO BERRIOZABAL, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL
Empresa:	GENERANDO IDEAS CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (I):	ING.DANIEL MEDINA PINEDA
Monto Contratado:	\$1,415,891.06
Fecha de Inicio de los Trabajos:	
Fecha final de los trabajos:	
Avance Físico:	100 %


ÁLBUM FOTOGRÁFICO




FACHADA



ÁREA EXTERIOR



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

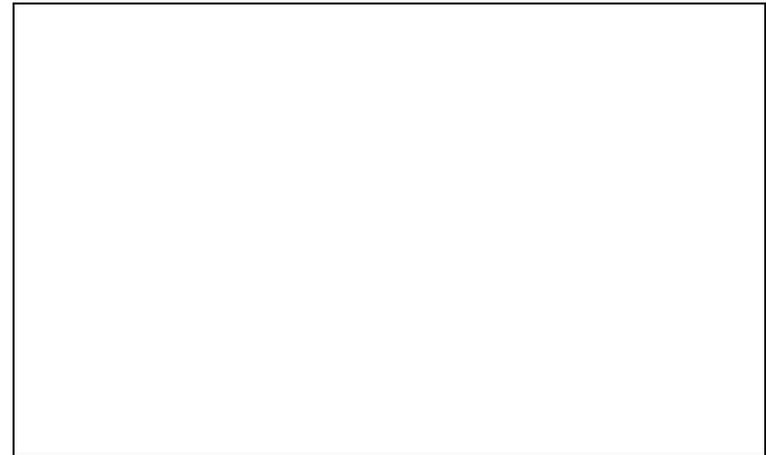

SALA DE ESPERA

Obra:	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, MUNICIPIO DE CINTALAPA
Empresa:	CUIDA, S.A. DE C.V.
Supervisor del Distrito (I):	ARQ. LAURA GABRIELA ELÍAS SÁNCHEZ
Monto Contratado:	\$3,041,846.62
Fecha de Inicio de los Trabajos:	09 de noviembre 2023
Fecha final de los trabajos:	30 de diciembre 2023
Avance Físico:	100 %

ÁLBUM FOTOGRÁFICO



FACHADA



ÁREA EXTERIOR



TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN



SALA DE ESPERA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DE SALUD
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL (E001)
AVANCE FISICO - FINANCIERO

INFORME AL 31 DE ENERO DE 2024

No.	DISTRITO DE SALUD	TIPO DE UNIDAD	NOMBRE DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CONTRATISTA	No. DE CONTRATO	MONTO AUTORIZADO/MODIFICADO	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO	SALDOS	AVANCES	
												FÍSICO (%)	FINANCIERO (%)
1	II	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS	CHAMULA	SAN JUAN CHAMULA	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES MARELY, S.A. DE C.V.	14-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 2,701,227.64	\$ 2,701,227.64	\$ 1,944,883.92	\$ 756,343.72	100%	72%
2	IX	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE OCOSINGO, MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS	OCOSINGO	OCOSINGO	PEDRO ANTONIO GARCÍA BALLINAS	17-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 2,973,235.08	\$ 2,973,235.08	\$ 1,828,539.57	\$ 1,144,695.51	100%	61%
3	IV	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE REVOLUCIÓN MEXICANA, MUNICIPIO DE VILLACORZO, CHIAPAS	VILLACORZO	REVOLUCIÓN MEXICANA	MIRELLA ESTUDILLO LÓPEZ	27-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 3,736,151.94	\$ 3,736,151.94	\$ 2,887,848.71	\$ 848,303.23	100%	77%
4	V	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TAPILULA, MUNICIPIO DE TAPILULA, CHIAPAS	TAPILULA	TAPILULA	CUIDA, S.A. DE C.V.	33-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 2,974,958.92	\$ 2,974,958.92	\$ 2,338,204.39	\$ 636,754.53	100%	79%
5	I	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE CHIAPA DE CORZO, MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS	CHIAPA DE CORZO	CHIAPA DE CORZO	MIRELLA ESTUDILLO LÓPEZ	39-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 1,451,695.58	\$ 1,451,695.58	\$ 1,178,217.79	\$ 273,477.79	100%	81%
6	I	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DR. MANUEL VELASCO SUAREZ ACALA, MUNICIPIO DE ACALA, CHIAPAS	ACALA	ACALA	CUIDA, S.A. DE C.V.	40-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 3,456,643.04	\$ 3,456,643.04	\$ 2,972,379.90	\$ 484,263.14	100%	86%
7	X	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DEL PORVENIR, MUNICIPIO DE EL PORVENIR, CHIAPAS	EL PORVENIR	EL PORVENIR	TORRES Y VELAZQUEZ INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	44-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 3,506,567.68	\$ 3,506,567.68	\$ 3,138,378.06	\$ 368,189.62	100%	89%
8	III	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE LAS MARGARITAS, MUNICIPIO DE LAS MARGARITAS, CHIAPAS	LAS MARGARITAS	LAS MARGARITAS	GRUPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES ALCAZAR, S.A. DE C.V.	45-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 4,803,729.05	\$ 4,803,729.05	\$ 4,299,337.50	\$ 504,391.55	100%	90%
9	I	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE CINTALAPA DE FIGUEROA, MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS	CINTALAPA	CINTALAPA DE FIGUEROA	CUIDA, S.A. DE C.V.	46-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 3,041,846.62	\$ 3,041,846.62	\$ 2,488,230.54	\$ 553,616.08	100%	82%
10	II	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO DE TEOPISCA, MUNICIPIO DE TEOPISCA, CHIAPAS	TEOPISCA	TEOPISCA	VELFER INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	73-ISA-DIS-LP-E001-2023	\$ 1,634,095.19	\$ 1,634,095.19	\$ 1,364,206.18	\$ 269,889.01	100%	83%
11	VIII	H.B.C.	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL H. B. C. DR. RAFAEL ALFARO GONZÁLEZ PIJJIAPAN, MUNICIPIO DE PIJJIAPAN, CHIAPAS	PIJJIAPAN	PIJJIAPAN	COINTECH PROYECTOS, INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	06-ISA-DIS-AD-E001-2023	\$ 534,371.80	\$ 534,371.80	\$ 534,371.80	\$ -	100%	100%
12	VI	H.B.C.	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO SALTO DE AGUA, MUNICIPIO DE SALTO DE AGUA, CHIAPAS	SALTO DE AGUA	SALTO DE AGUA	AG DISEÑOS Y OBRAS CIVILES DE MEXICO S.A. DE C.V.	86-ISA-DIS-AD-E001-2023	\$ 1,801,343.40	\$ 1,801,343.40	\$ 1,549,155.32	\$ 252,188.08	100%	86%
13	I	H.B.C.	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL BÁSICO COMUNITARIO BERRIOZABAL, MUNICIPIO DE BERRIOZABAL, CHIAPAS	BERRIOZABAL	BERRIOZABAL	GENERANDO IDEAS CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	97-ISA-DIS-AD-E001-2023	\$ 1,415,891.06	\$ 1,415,891.06	\$ 424,767.32	\$ 991,123.74	100%	30%
TOTAL:								\$ 34,031,757.00	\$ 34,031,757.00	\$ 26,948,521.00	\$ 7,083,236.00		


DR. AURELIANO DE JESÚS GÓMEZ CORDERO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD
